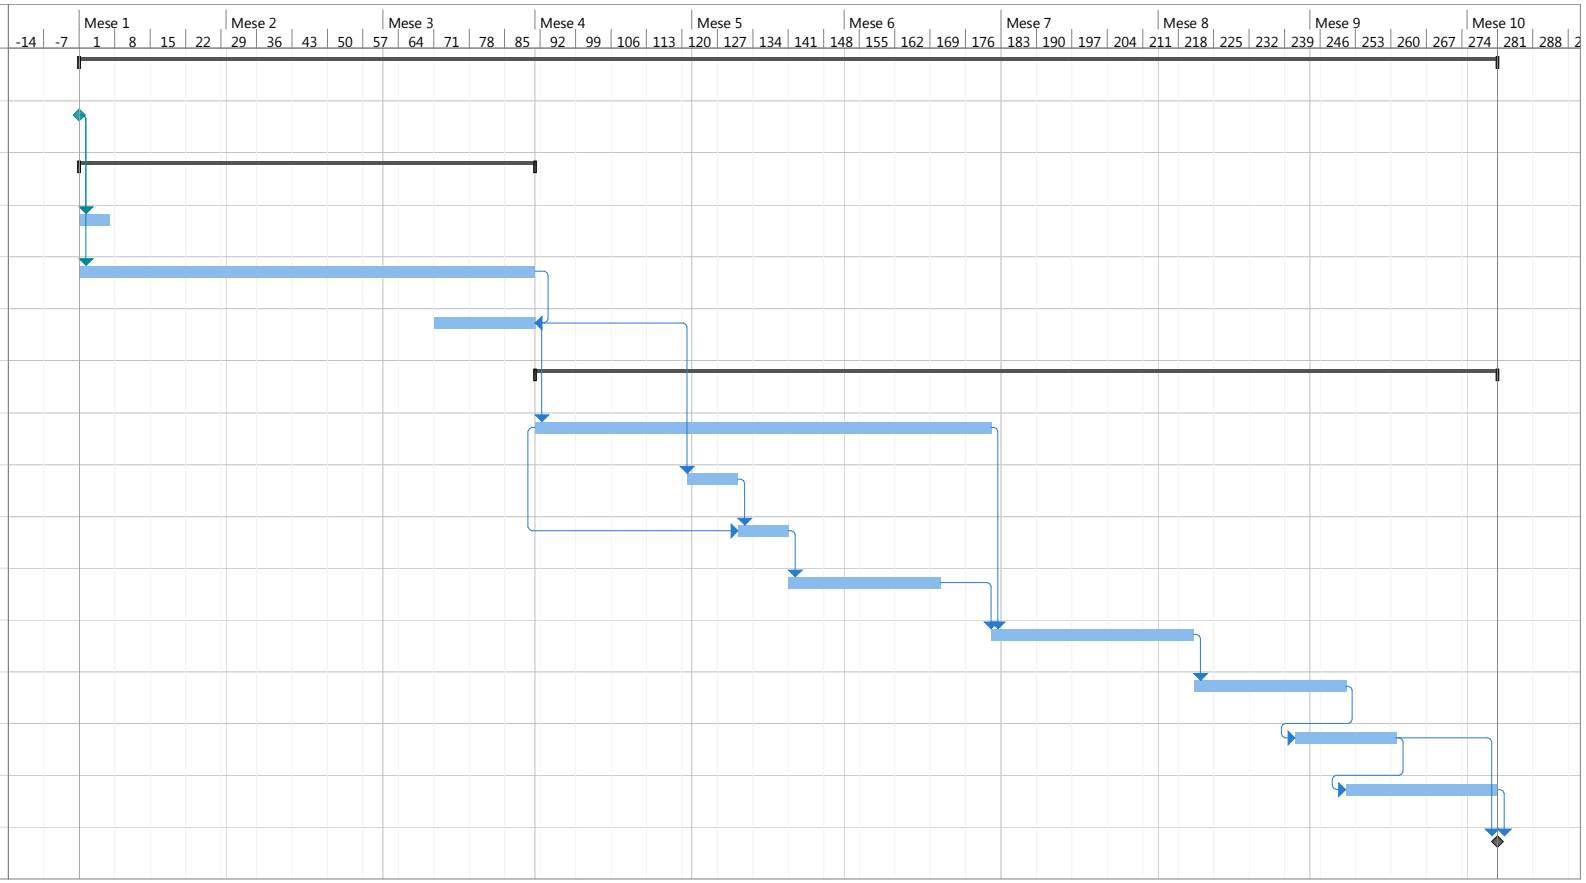ID	Nome attività	Durata
1	**REALIZZAZIONE AREA STOCCAGGIO COLLI**	**280 g**
2	Inizio attività	0 g
3	**PROGETTAZIONE**	**90 g**
4	Rilievi	6 g
5	Progettazione esecutiva	90 g
6	Sorveglianza e approvazione	20 g
7	**NUOVE REALIZZAZIONI**	**190 g**
8	Fornitura materiali	90 g
9	Cantierizzazione aree	10 g
10	Posa cordolo e predisposizione ancoraggi sovrastruttura	10 g
11	Pozzetti e massetto	30 g
12	Messa in opera carpenteria metallica	40 g
13	Posa pavimento e serramenti	30 g
14	Finiture e installazione impianti	20 g
15	Allacciamento impianti	30 g
16	Fine lavori	0 g
